


A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (09.10-ei) nappal bezárólag **142,6 m³**. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 317 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és fölöző rendszert érintő változások

A héten új kút fúrására nem került sor. Az előző heti helyszínrajz jelenleg is aktuális. (A helyszínrajzon fekete pöttyökkel további tervezett fölöző kutak vannak jelölve).

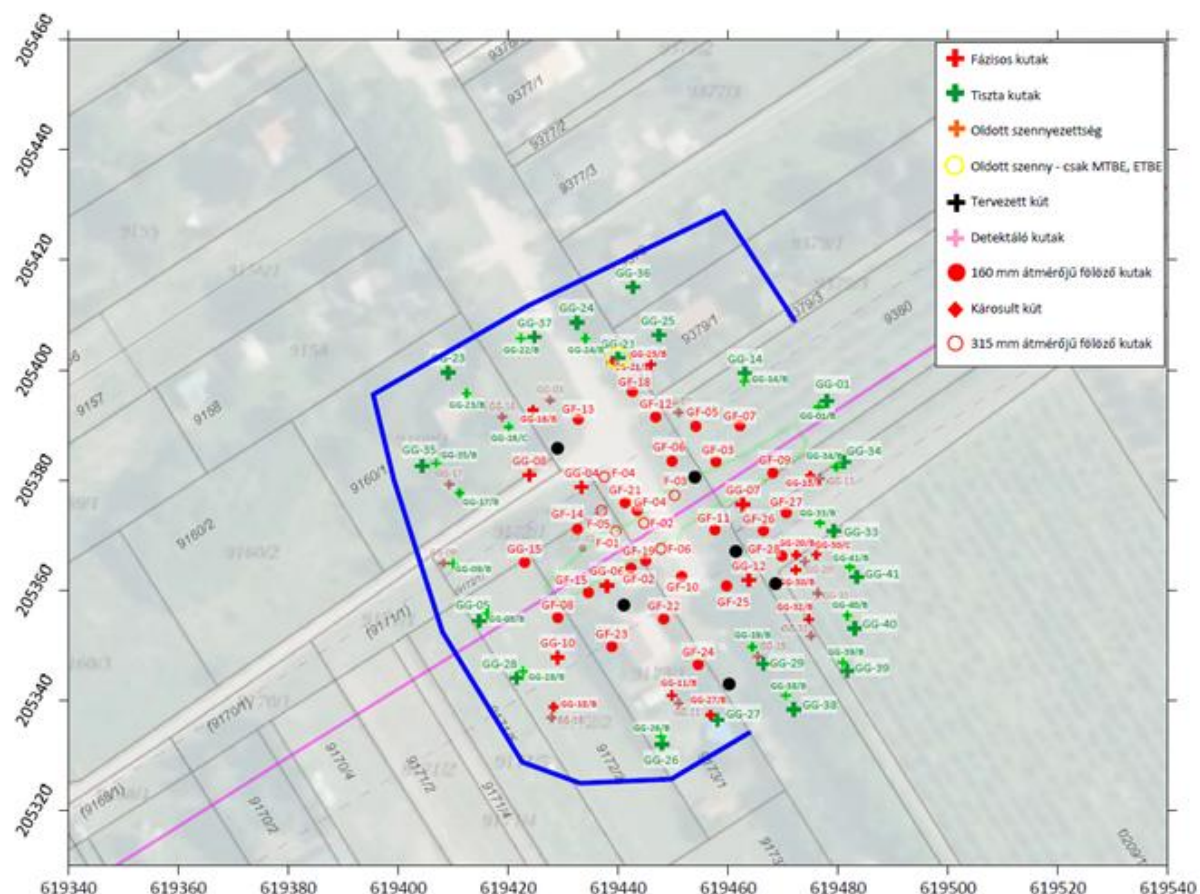


Az izolációs fal kialakítása

Jelenleg a fal északi szakaszának építése van folyamatban. Ez a szakasz tervezetten pénteken elkészül, és jövő héttől a vezeték szűkebb környezetében (az utolsó kivitelezési szakaszon) fog folytatódni a fal építésének befejezése.

A helyreállítási munkálatok részeként megkezdődött a lavírsík bontása. (A teljes nyomvonalon az izolációs fal teljes elkészültét követően lehet elbontani a lavírsíkot).

A 09.10-ei készültségi fokot ábrázoló helyszínrajz:

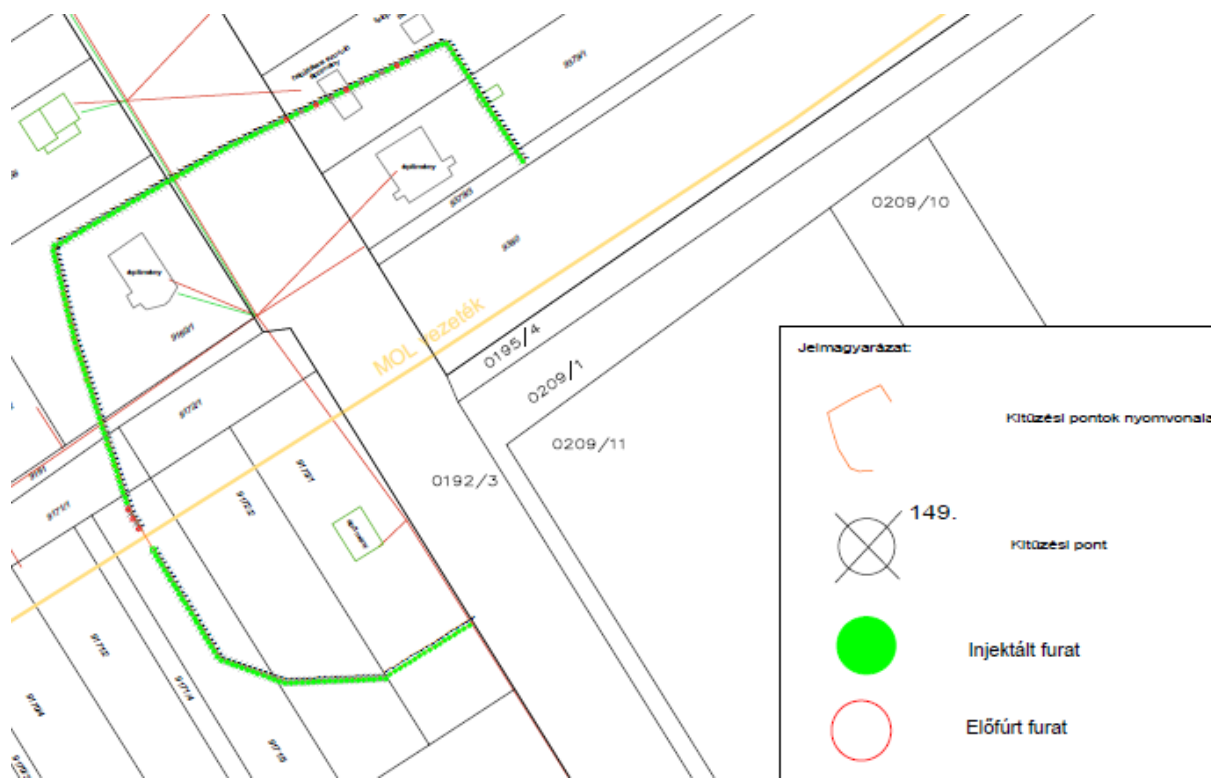

Egyéb vizsgálatok:

Az Önkormányzattal közös program keretében lakossági vízmintavételi program indult a szennyezett terület környezetében (elsősorban 200m-es távolságon belüli ingatlanok esetében).

Ahol van lehetőség bontás nélkül vizsgálni a kutat, ott felszín alatti víz vizsgálatára kerül sor, ahol nincs, ott csapról történik a mintavétel. A laborban üzemanyag eredetű szennyezettség vizsgálatára kerül sor.

A vizsgálatokat igényfelmérés előzte meg, ütemezetten, várhatóan 3-4 hét alatt kerül sor a mintavételekre.
