

A **kitermelő rendszer** napi kb. 500 liter eltávolított mennyiséggel üzemel. A teljes eltávolított mennyiség 79 m^3 .


23-án sor került a második tartálykocsis kitermelt kevert üzemanyag Dunai Finomítóba történő beszállítására (A beszállított mennyiség 19.200 kg , kb. 24 m^3). Részben emiatt, illetve a fázis nyomásszintek ellenőrzése céljából 24 órára leállításra került a kitermelő rendszer, 24-én, 35 db. kútban történt egyidejű nyugalmi fázisszintmérést követően indult újra. A fázisszint adatok alapján van lehetőség optimalizálni a rendszer működését, szivattyúkat áttelepitni, cserélni.

Szennyezettség nyomon követése:

22-én sor került minden lehatároló kút mintavételére is (érzékszervileg nem tűnt szennyezettnek egyik kút sem), valamint a /B jelű indikátor kutak fázismérésére. A minták a laborban vannak.

22-én befejeződött a GG-19 és a GG-20 eltömedékelése. Az ezeket kiváltó, kizárással készülő kutak várhatóan a jövő héten készülnek el, 28-án kezdődnek a fúrások.

Az aktualizált helyszínrajz az új lehatároló kutak jelölésével (a megszüntetett kutak közelében kerülnek kialakításra):

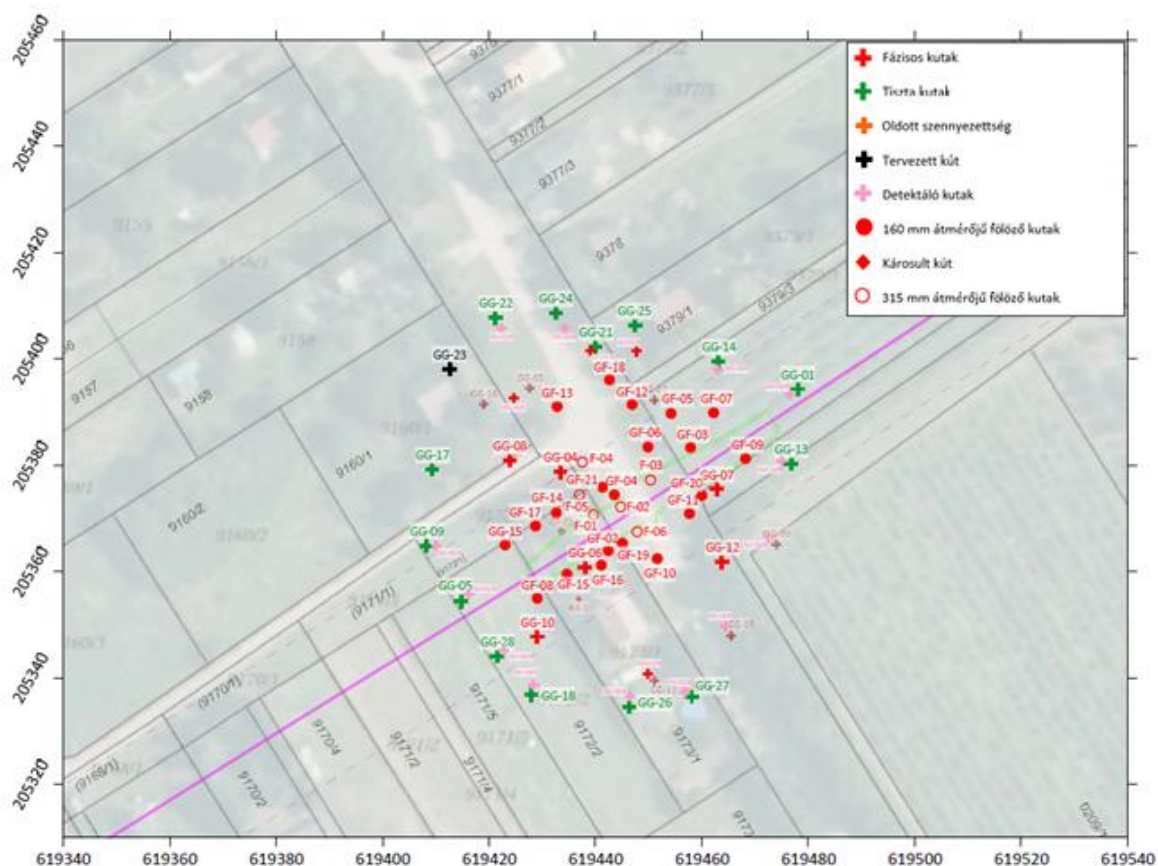

Az **izolációs fal** kivitelezése (próbaforások) során 21-22 m körüli mélységben egy kemény homokkő réteg lassítja az előrehaladást, így az elmúlt napokban több fúrászarat, szerszámot kipróbáltak. Azokon a részekén ahol az előzetes vizsgálatok (CPT), alapján számítani kell a homokkő padra, ott kisebb átmérőjű spirál fúróval célszerű előfúrni a furatot az 1300mm-es átkeverés előtt. A felszín alatti rétegződés minél jobb megismerése végett magfúrásokra is sor került.

A próbaforásokkal párhuzamosan folytatódott a nyomvonal előkészítése (bontás, cserjeirtás, humuszosítás, tömörített lavírsík építése).

Benyújtásra került a hiánypótlási végzés szerint **kiegészített tényfeltárási záródokumentáció**.

