

A kitermelő rendszer üzemel, az eddig a rendszerrel eltávolított mennyiség: 87,25 m³. Megközelítőleg 400 liter/nap üzemanyagot sikerült eltávolítani a héten.

A napokban érkezik 2db új alsó beömlő nyílású szivattyú, ezek beépítésre kerülnek.

Szennyezettség, monitoring rendszer:

A GG-18 jelű kút (délnyugati térrész) eredménye a korábbiaknál alacsonyabb szennyezettséget mutatott, az ETBE-MTBE ezúttal is kimutatásra került, de más komponens nem érte el a B értéket. Egyelőre megerősíti azt a feltételezést, hogy folyamatos utánpótlódással járó kapcsolat még nem alakult ki az üzemanyag és a felszín alatti víz között, vagy inkább a kutat megközelítő (18/B indikátor kútban is megjelenő) önálló fázis lehetett az eredete a szennyezettségnek.

A GG-17 jelű kút sem kizárással készült és ennek nincs /B kútpárja, ezért ezt is célszerű eltömedékelni és új kutat kialakítani helyette (GG-35).


A GG-25 március óta van mintázva, először lett szennyezett (a környezetében lévő kutak nem szennyezettek, újramintázás tervezett).

A GG-29 és GG-31 új kutak, kis mértékben és eltérő összetétellel lett szennyezett az eredményük, újramintázás mellett ezen a térrészen indokoltnak látjuk bővíteni a lehatároló kutak körét.

Jövő hét elejére beütemezésre kerültek a mintavételek.

Az új kutak fúrása a május 26-ai hétre van tervezve.

Az aktualizált helyszínrajz:

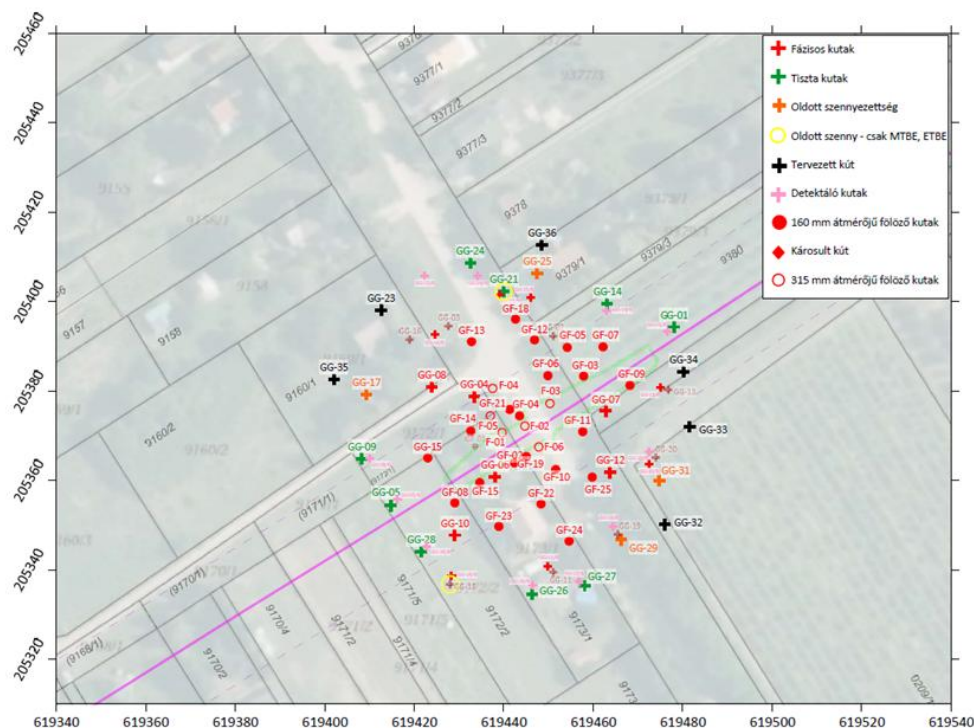

A résfal építése a páratlan furatok előfúrásaival előkészített nyomvonal szakaszon folytatódott. A tapasztalatok alapján az eredetileg tervezett ütemezésen módosítani kell a következő időszak előrehaladása alapján.

A nyomvonal, lavírsík előkészítése is folytatódott a 9378 és 9379/1 hrsz ingatlanokon. Teherbírás mérések következnek, és szükség szerint sor kerül további megerősítésre.

A vezeték keresztezése is előkészítés alatt áll, folyamatban van a teherelosztás tervezése.
