

A kitermelő rendszer üzemeltetésével kitermelt mennyiség: 92 m³

Az üzemeltetés mellett a rendszer kialakításának-véglegesítésének munkálatai is zajlanak: folyamatban van a kútaknak betonozása és a tartályok környezetében villámhárítók telepítése.

Pénteken (05.30-án) kerül sor a következő tartálykocsis beszállításra a finomítóba.


A minél hatékonyabb csóvaperemi „fölözések” érdekében új, egyedi megrendelésre gyártott kézi fölöző kanalat szerzett be az üzemeltető (alacsonyabb, de szélesebb).

Aktuális eredmények, kúthálózat

Megérkezett a két héttel ezelőtti eredmények miatt megismételt mintavételek jegyzőkönyve. A GG-25,29,31 jelű kút eredménye is szennyezettségi határérték alatti. A GG-17-es nem rétegzárassal készült kút viszont újra B érték feletti eredményt adott – ez a kút időközben eltömedékelésre is került. Nagy valószínűséggel közel jár az önálló fázisú szennyezettség.

A monitoring rendszerben több új lehatároló (vagy lehatárolást pontosító) kút is létesült. Elkészült a GG-23, GG-32, GG-32/B, GG-33, GG-33/B, GG-34 jelű kút. (A GG-23 és GG-35 az eltömedékelte GG-17 környezetében van.)

Az aktualizált helyszínrajz (az új kútaknál a zöld jelölés egyelőre az érzékszervi tapasztalatokon alapszik):

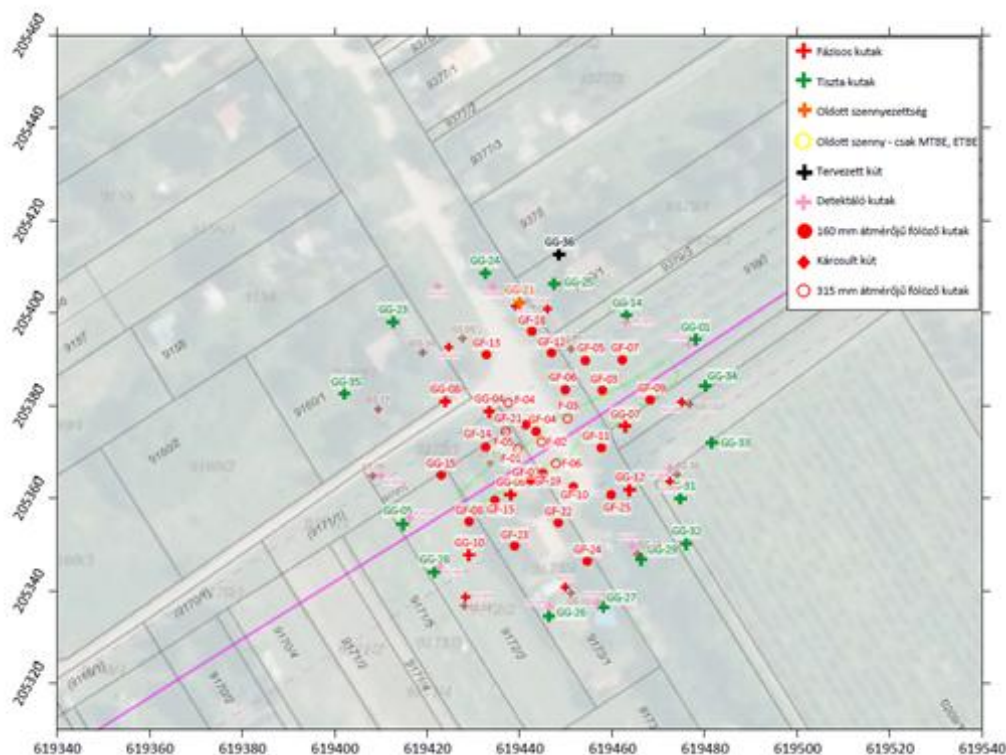

Az izolációs fal építése során kisebb előrehaladás mellett a héten inkább előfúrások zajlottak, ennek során a vezeték felett is áthaladt a gép. A biztonság végett nem történt szállítás és az üzemfelügyeleti rendszer jelzéseit is figyelték a kollégák. A helyszínrajzon az elkészült fal szakaszát zöld, az előfúrt szakaszt kék vonal jelöli. (hétfőig tervezetten eljutnak a kék pontig, ekkor átszerelnek és folytatják a fal építését).



Egyéb vizsgálatok

A héten újabb lakossági mintavételre került sor (9375/3 hrsz). Érzékszervileg tisztának tűnt, a minta a laborban van. A tulajdonosnak nem volt észrevétele, kérésre, elővigyázatosságból történt a mintavétel a kút tervezett használata miatt.
