

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **145,1 m³.**
(Az elmúlt héten átlagosan kb. 313 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és fölöző rendszert érintő változások

Megérkezett a lehatároló kutak 09.09-ei mintavételének eredménye, a szennyezettségben nincs érdemi, jelentős változás.

A közvetlenül az izolációs fal mellett lévő GG-27-es kút a fal építése, terepi munkák következtében tönkrement, a szennyezettség vertikális terjedési kockázatának megszüntetése miatt ez a kút eltömedékelésre került.


Az aktualizált helyszínrajz:



Az izolációs fal kialakítása

A fal építése a vezeték szűk környezetének kivételével befejeződött. Ezen a vezeték melletti szakaszon folyamatban van a fal építése. (Ezen a szakaszon döntött és függőleges toronnyal végzett injektálásokra is sor kerül.)

Az aktuális készültségi fokot ábrázoló helyszínrajz:

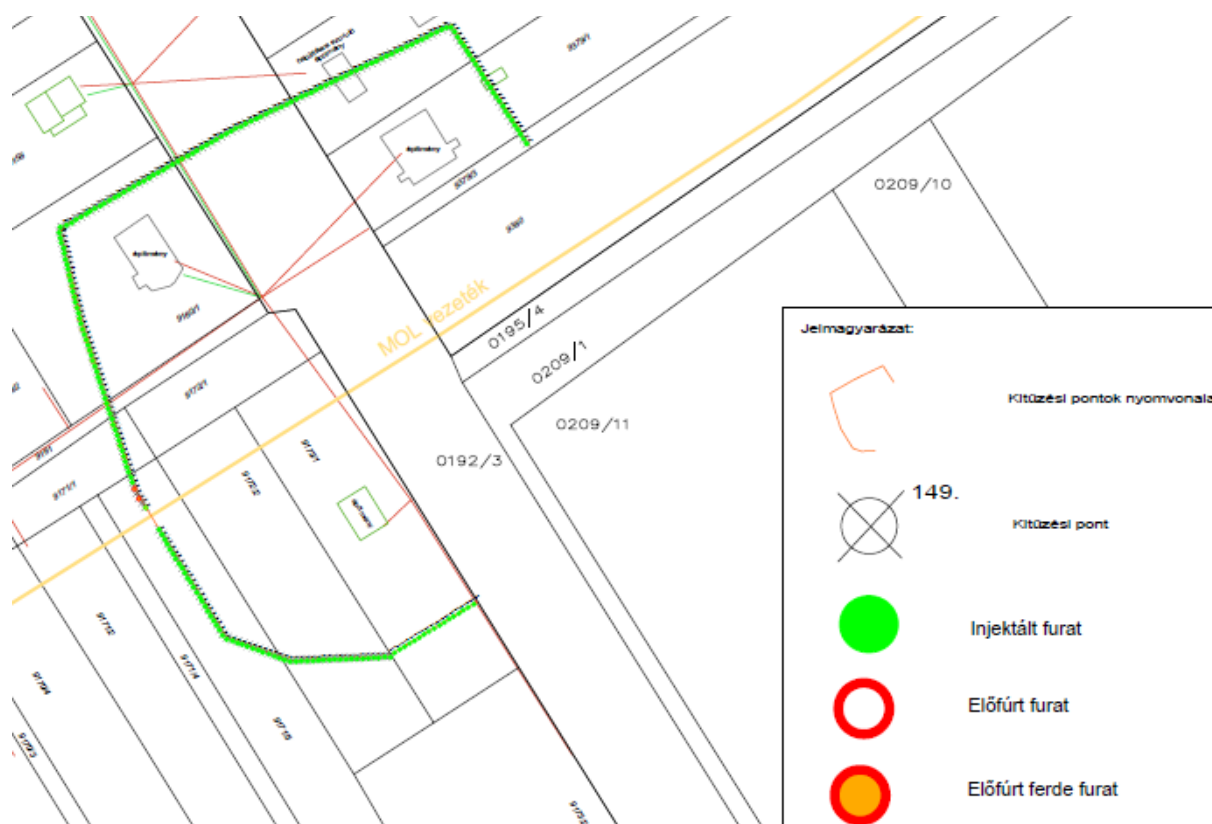

Egyéb vizsgálatok:

A múlt heti jelentésben említett, Önkormányzattal közös lakossági vízmintavételi program keretében megkezdődtek a mintavételek.
