


A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **147,2 m³**.
(Az elmúlt héten átlagosan kb. 300 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és fölöző rendszert érintő változások

A szénhidrogén kitermelő kúthálózat és monitoring rendszer fejlesztése folyamatban van. A kitermelő kutak a terjedésgátlást, illetve góc szennyezettségének csökkentését, a monitoring kutak pedig a szennyezettség lehatárolásának pontosítását szolgálják egyes részterületeken. A GG-21 jelű (nem lehatároló) kút a vertikális terjedés kockázatának megszüntetése végett eltömedékelésre került.

A változásokat, tervezett további fúrásokat (monitoring ill. fölöző kutakat) is jelölő aktualizált helyszínrajz:

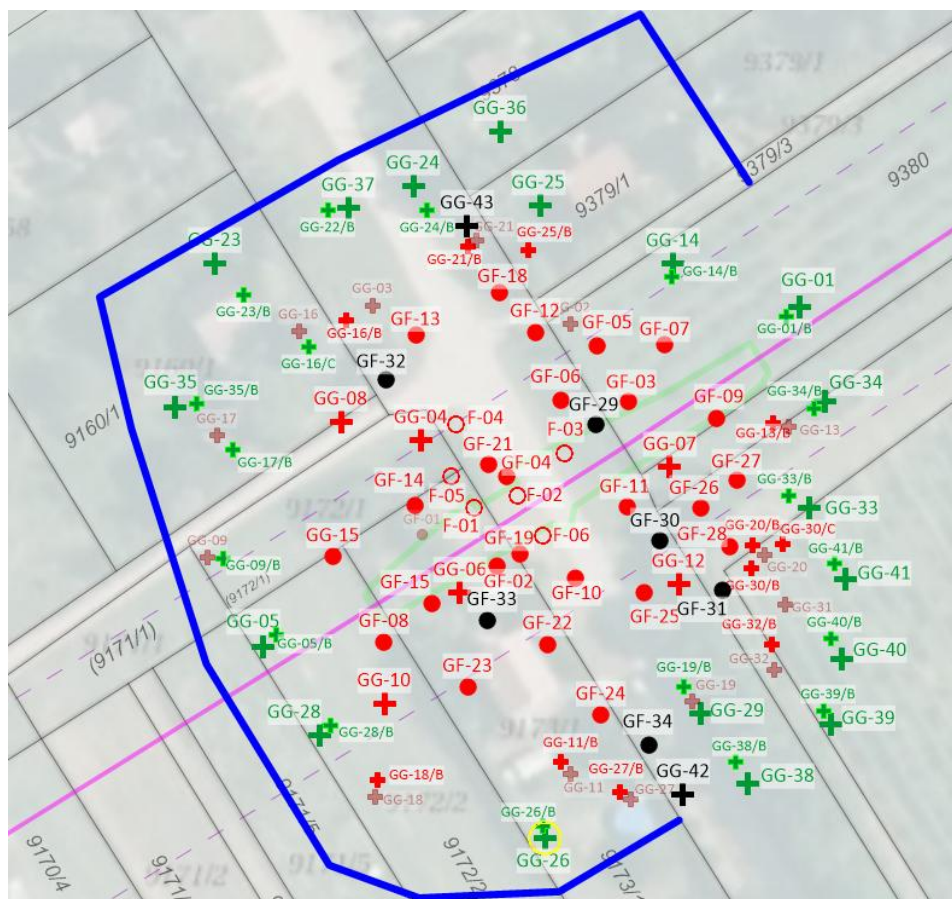

Az izolációs fal kialakítása

A fal építése befejeződött, a terület helyreállítása folyamatban van. A teljes levonulás várhatóan mintegy két hetet vesz igénybe (lavírsík elbontása, humusz visszatöltése, tereprendezések, berendezések bontása, elszállítása). Illetve sor kerül az egyéb helyreállításokra is.

Az elkészült falat ábrázoló helyszínrajz:

Megjegyzés az ábrázolt nyomvonálhoz: a rajz a fúrásponatok felszíni pontjait ábrázolja, ezért a vezeték környezetében csak a felszíni pontok vannak jelölve, a felszín alatti falszakasz nincs ábrázolva, de a ferde (döntött toronnyal végzett) fúrások a tervezett mélységben metsződnek és folytonos falat képeznek.

