


A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a tegnapi (08.27-ei) nappal bezárólag **137,9 m3**. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 350 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring rendszert érintő változások

A monitoring és fölöző rendszer tervezett kiegészítése (3db új fölöző, 4db új monitoring és 3db indikátor kút) elkészült.

A fúrások során vett talajminták megérkeztek: a fölöző kutak mintegy 15-16m mélységközben szennyezettek, a monitoring és az azok közelében mélyített, talaj szennyezettségét vizsgáló indikátor kutak szennyezetlenek.

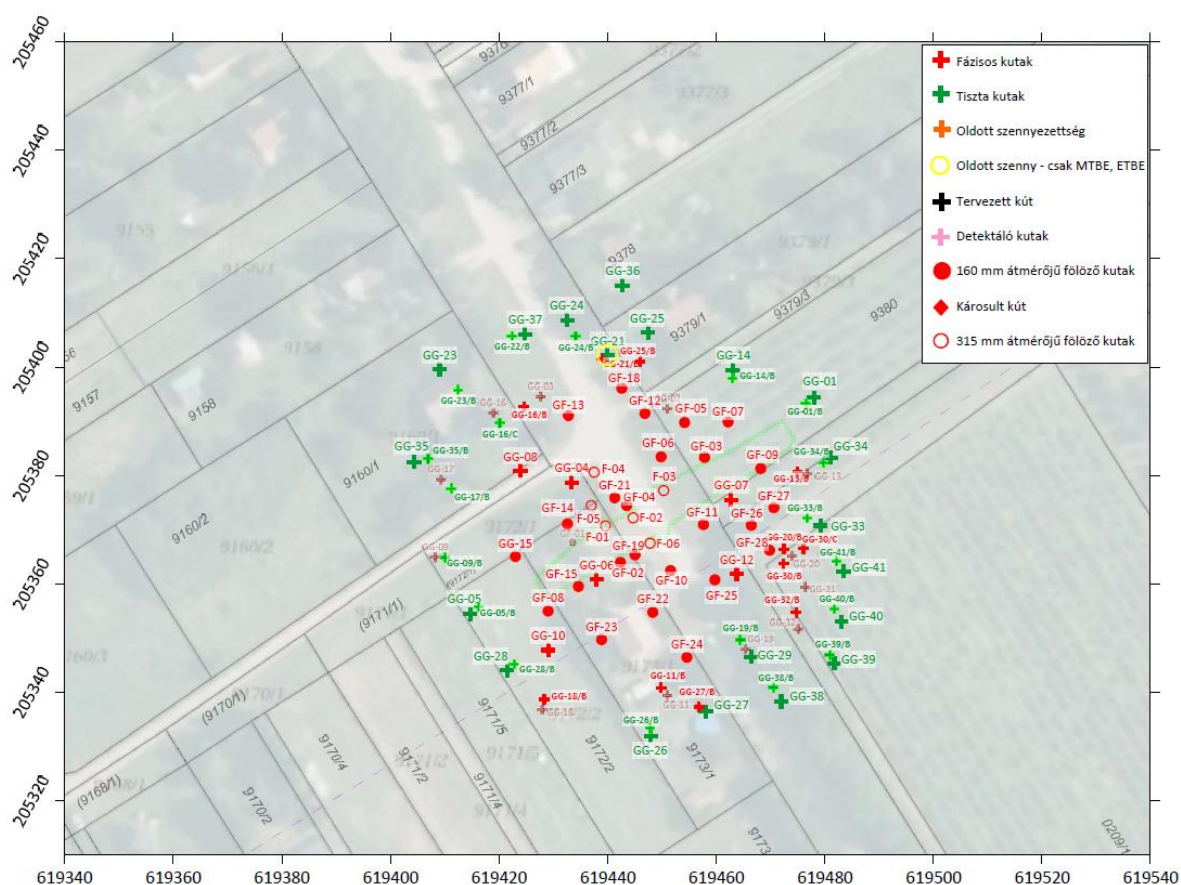

Az izolációs fal kialakítása

A héten befejezték az északi terület hiányzó előfúrásait, valamint átszerelést követően a déli szakaszon befejeződött a fal építése. Mai napon áttelepültek az északkeleti végpontra, és megkezdték az injektálásokat.

