

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 140,7 m³. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 350 liter/nap.)


Szennyezettség nyomon követése, monitoring és fölöző rendszert érintő változások

A héten megérkezett a 08.26-ai vízmintavétel, valamint a kiegészítő monitoring kutak fúrása során vett talajminták laborjegyzőkönyve. Az eredmények alapján lehatárolt a szennyezetttség (a GG-38,39,41 jelű monitoring kutakból egyelőre talaj eredmények állnak rendelkezésre). A GG-21 kútban kimutatható kisebb mértékű ETBE-MTBE szennyezettség (11-12 ug/l).

A 9171/3 hrsz ingatlanon vett vízminta eredménye is megérkezett, minden komponens kimutatási határérték alatti.

További fölözőkutak létesítése is tervben van (helyszínrajzon fekete pöttyökkel jelölve): a szennyezett terület peremére tervezett kutak elsődleges célja a terjedésgátlás, a gócterülethez közelebbre tervezett kutak célja az eltávolítható üzemanyag mennyiségének növelése, illetve hosszabb távon szinten tartása.

Az aktualizált helyszínrajz:

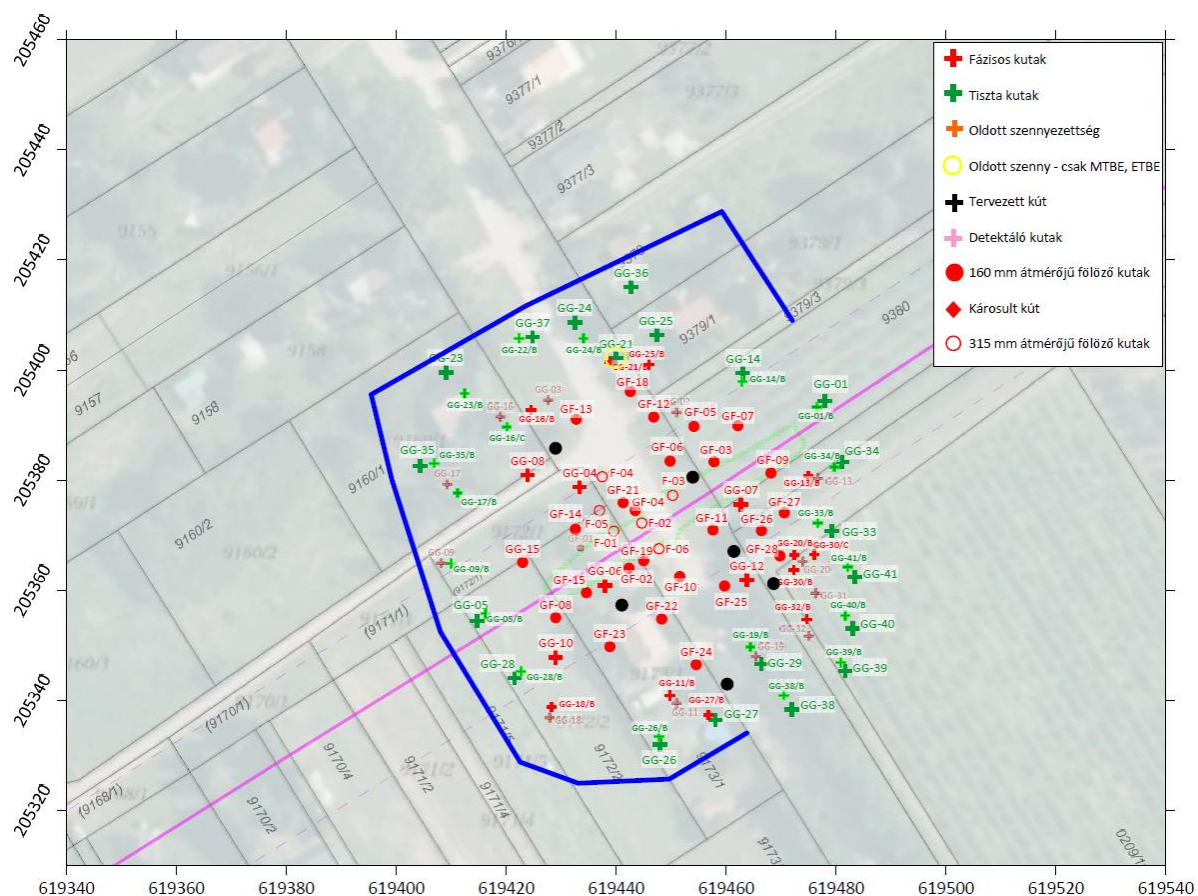

Az izolációs fal kialakítása

Jelenleg a fal északi szakaszának építése van folyamatban. Ennek elkészültét követően a vezeték szűkebb környezetében fog folytatódni a fal építésének befejezése.

Az aktuális készültségi fokot ábrázoló helyszínrajz:

