


A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **165,3 m³**. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 213 liter/nap)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

- A héten a kétheti rendszerességű mintavételre kijelölt (mellékelt helyszínrajzon lila karikával jelölt) monitoring kutak november 28-ai mintavételének eredménye érkezett meg. **Az eredmény a korábbiakhoz hasonló, a GG-26 kút kismértékű (15-15 ug/l) ETBE-MTBE szennyezettséget mutatott, minden más monitoring kút eredménye kimutatási határérték alatt adódott.**

A falon kívüli monitoring rendszer bővítése befejeződött, minden tervezett monitoring kút elkészült.

A helyszínrajzon a korábbi térképen még nem jelölt, utóbbi időszakban elkészült kutak lila színnel vannak jelölve.

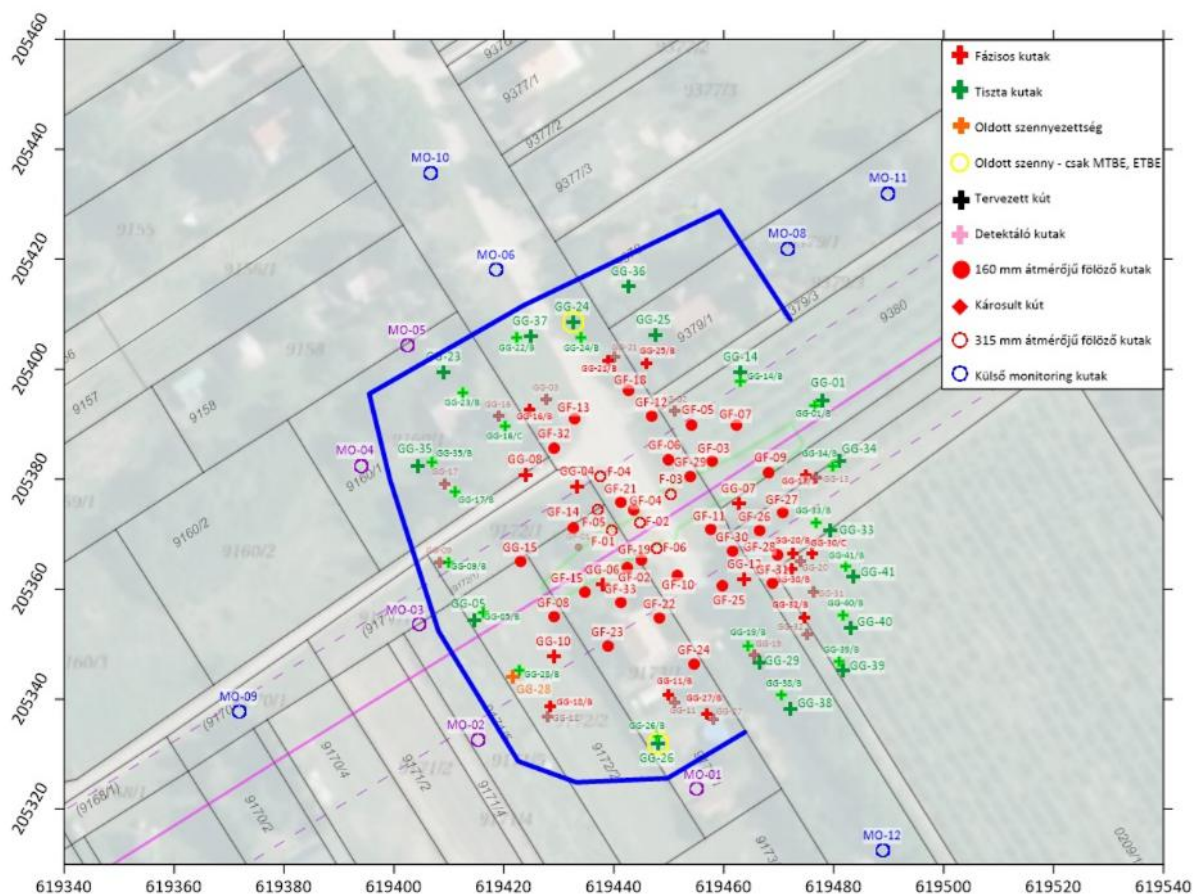

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása folyamatban van.

- **11.25-én befejeződött a kitermelő és nyelető kútpárok kialakítása, minden tervezett kút elkészült.**
- A kialakított termelő- és nyeletőkutak kompresszorozása és tisztítószivattyúzása mellett folyamatban van a vízgyűjtő hálózat termelőcsöveinek és a szivattyúk működtetéséhez szükséges pneumatikus csővezetékek behúzása a korábban fektetett védőcsövekbe.
- A vízkezelő berendezés telepítési helyén (9173/1 hrsz ingatlanon) elkészült a beton elemekkel megerősített alapzat.

A vízkezelő rendszer helyszínrajza:

