

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **174,9 m³**. (Az elmúlt héten átlagosan 138 liter/nap).


Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A héten megkezdődtek ez előző heti jelentésben említett fúrások a monitoring kúthálózat karbantartásának, bővítésének céljából. Jelenleg 3db (GG-42,45,47) kút készült el kizárásig, illetve a hozzájuk tartozó /B jelű indikátor kutak. Emellett folyamatban van a GG-24 és GG-26 jelű kutak eltömedékelése a szennyezettség vertikális terjedésének minimalizálása céljából, a szűrőzött szakaszok már eltömedékelésre kerültek.

A héten megérkezett a 01.22-én vett minták laboratóriumi jegyzőkönyve. A GG-24 jelű kút eredménye szennyezett volt, ezen felül a GG-26 és GG-35 jelű kutak mutattak kisebb mértékű (B) szennyezettségi határérték túllépést. Az eredmény megerősíti a GG-24 és GG-26 jelű kutak eltömedékelésének szükségességét. Mindegyik szennyezett kút az izolációs falon belül helyezkedik el. A laborjegyzőkönyv a jelentéshez mellékelten található.

A következő monitoring mintavételekre, vízszintmérésekre és indikátor kút ellenőrzésekre holnap (02.06-án) kerül sor.

A változások átvezetésre kerültek a helyszínrajzon:

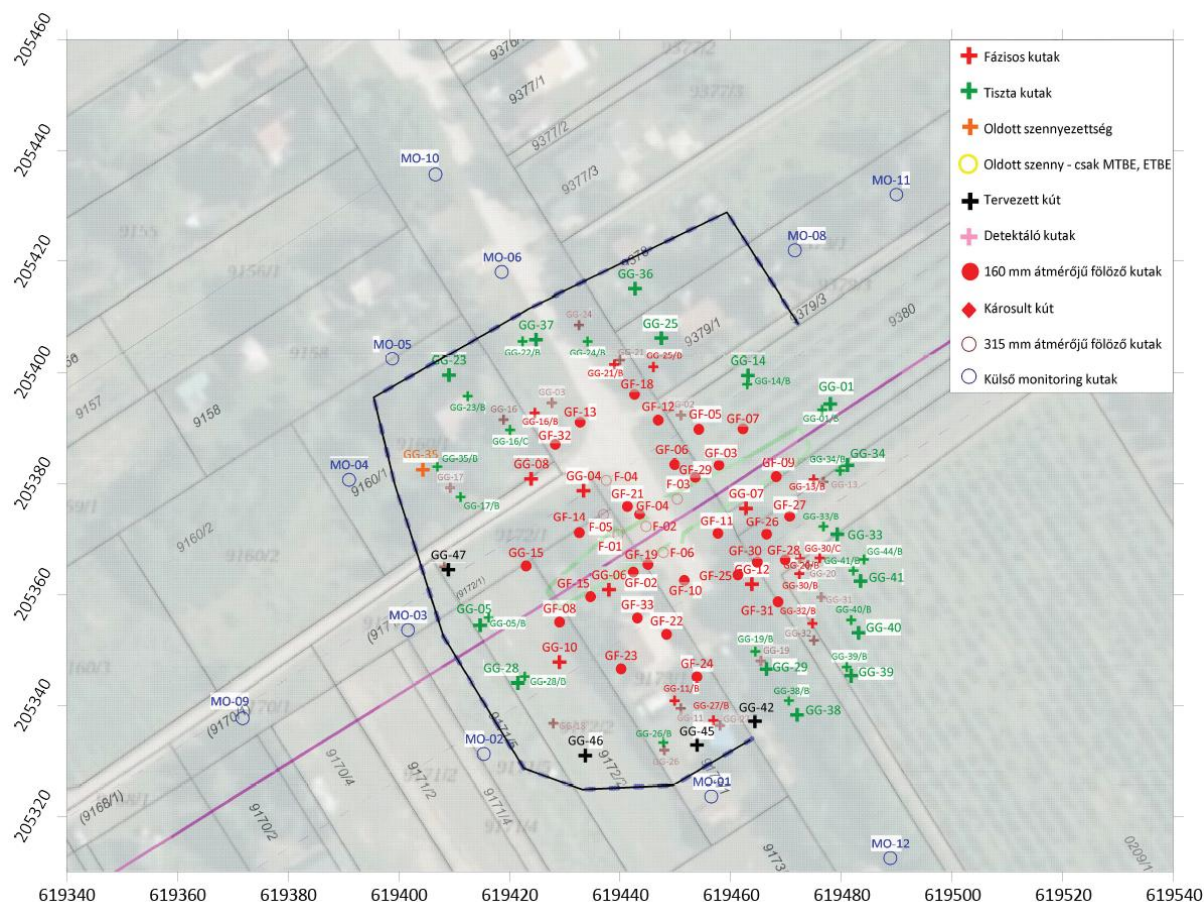

Az izolációs fal kiépítése 09.25-én, a terület helyreállítása 11.07-én befejeződött.

A vízkezelő rendszer kialakítása befejeződött, az üzempróba megkezdődött.

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

A vízkezelő rendszer üzempróbája folyamatban van, jelenleg nyomáspróbák, tömítések ellenőrzése zajlik.

Az üzempróbát követően kerülhet sor a rendszer próbaüzemére.
