

A kitermelő rendszer üzemel, az eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 175,3 m³.


Az elmúlt héten kitermelt mennyiség egy része a puffertartályok víztelenítése miatt nem került átfertésre a pótkocsis tartályba, így nem jelenik meg a nyilvántartásban. Jelenleg a puffertartályok töltődnek vissza az átfertési szintig.

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A monitoring kúthálózat karbantartásának, bővítésének keretében a helyszínrajzon jelölt GG-42,45,46,47 jelű kutak és /B jelű indikátor párjaik elkészültek.

Megérkezett a 02.06-ai, minden monitoring kutat magában foglaló mintavétel laboratóriumi jegyzőkönyve, minden kút eredménye (B) szennyezettségi határérték alatti. A jegyzőkönyvet mellékeltem.

Az aktualizált helyszínrajz (az új, GG-42,45,46,47 jelű kutakból még nem áll rendelkezésre vizsgálati eredmény):

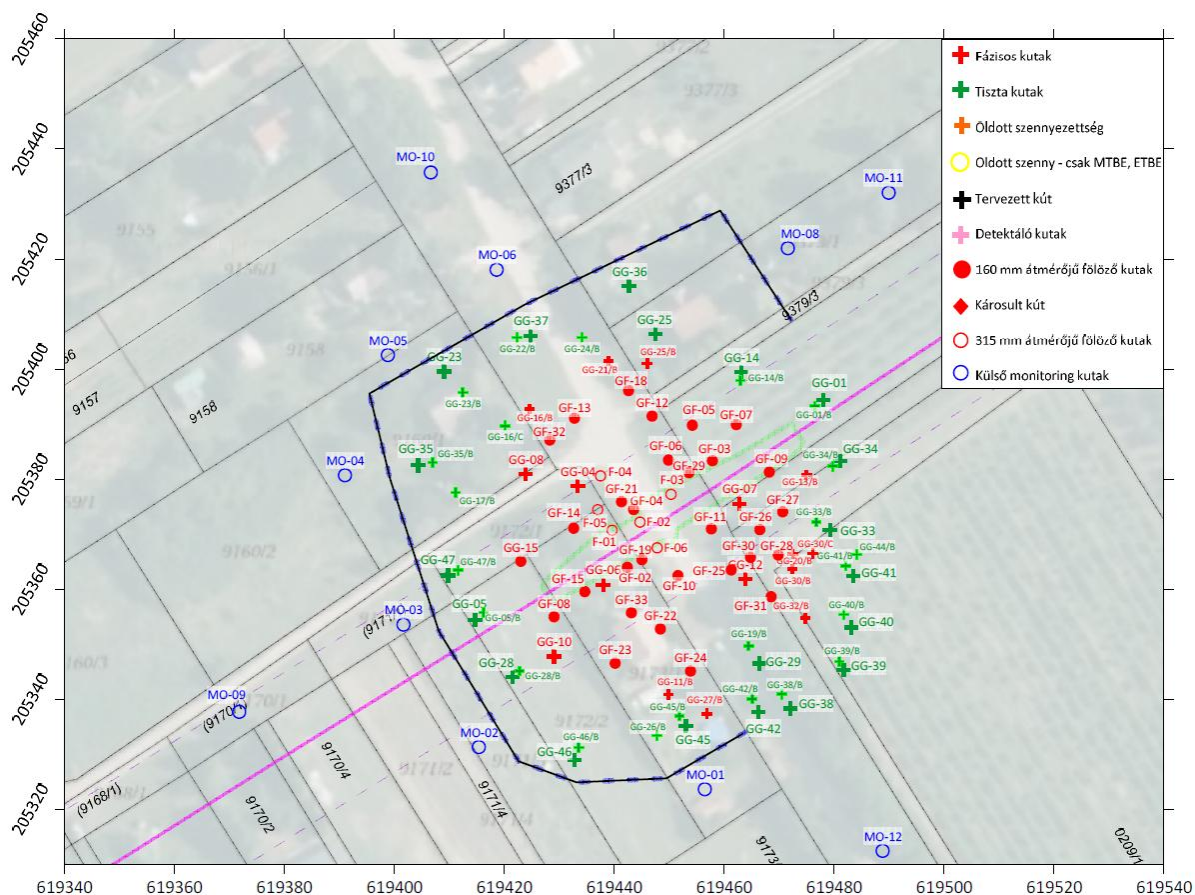

- A falnak a vízszintek alakulására a falon kívül nincs jelentős hatása, a víz megkerüli, érdemi vízszint csökkenést nem okoz az alvízi oldalon.
- A falon belüli vízszint a jelenlegi nyugalmi állapotban (vízkezelő rendszer üzemeltetése nélkül) az alvízi, mentett oldali szinthez képest 0,6-0,8m-rel magasabb a fal duzzasztó hatásának következtében.

A vízkezelő rendszer kialakítása befejeződött, az üzempróba megkezdődött.

A rendszer főbb részei: kitermelő és nyelető kútpárok, pneumatikus működtetésű szivattyúk, folyadékgyűjtő hálózat, felszíni vízkezelő rendszer.

A vízkezelő rendszer üzempróbája folyamatban van, jelenleg nyomáspróbák, tömítések ellenőrzése, javítása zajlik.

Az üzempróbát követően kerülhet sor a rendszer próbaüzemére.
